
Verkáætlun Traðarreitur Vestri
Verk 160
Útgáfa A

JÁVERK

ID	Verkþáttur	Upphaf	Lok
1	**Hönnun**	**Mon 1.4.24**	**Fri 30.1.26**
2	Frumhönnun	Mon 1.4.24	Wed 31.7.24
3	Aðaluppdrættir	Thu 1.8.24	Wed 26.2.25
4	Innlögn Byggingaráforma	Fri 10.1.25	Fri 10.1.25
5	Samþykkt byggingaráforma	Tue 21.1.25	Tue 21.1.25
6	Innlögn aðaluppdrátta	Wed 26.2.25	Wed 26.2.25
7	**Verkteikningar**	**Thu 27.2.25**	**Fri 30.1.26**
8	Neðanjarðar	Thu 27.2.25	Thu 29.5.25
9	Fasi 1 - Digranesvegur	Fri 30.5.25	Wed 30.7.25
10	Fasi 2 - Vallartröð	Thu 31.7.25	Tue 30.9.25
11	Fasi 3 - Neðstatröð	Wed 1.10.25	Mon 1.12.25
12	Fasi 4 - Mannlífsás	Tue 2.12.25	Fri 30.1.26
13	**Undirbúningur**	**Fri 31.1.25**	**Wed 18.6.25**
14	Kynning á vefsíðu	Fri 31.1.25	Thu 27.3.25
15	Færsla Lagnastofna	Thu 27.3.25	Wed 23.4.25
16	Aftengingar veitustofna	Thu 17.4.25	Thu 24.4.25
17	Endanleg girðing	Thu 20.3.25	Thu 24.4.25
18	Aðstöðusköpun	Thu 3.4.25	Wed 7.5.25
19	Bráðabirgða veitustofnar	Thu 17.4.25	Wed 30.4.25
20	Kynning á sprengivinnu í nærumhverfi	Thu 24.4.25	Wed 18.6.25
21	Úttektir á nærliggjandi húsum	Thu 24.4.25	Wed 18.6.25
22	**Framkvæmdir**	**Thu 24.4.25**	**Wed 17.10.25**
23	**Jarðvinna og rif**	**Thu 24.4.25**	**Wed 31.12.25**
24	Niðurrif	Thu 24.4.25	Wed 16.7.25
25	Jarðvinna	Thu 17.7.25	Wed 31.12.25
26	**Uppsteypa**	**Thu 6.11.25**	**Wed 1.12.27**
27	Bílakjallari	Thu 6.11.25	Wed 20.5.26
28	Fasi 1 - Digranesvegur	Thu 26.3.26	Wed 27.1.27

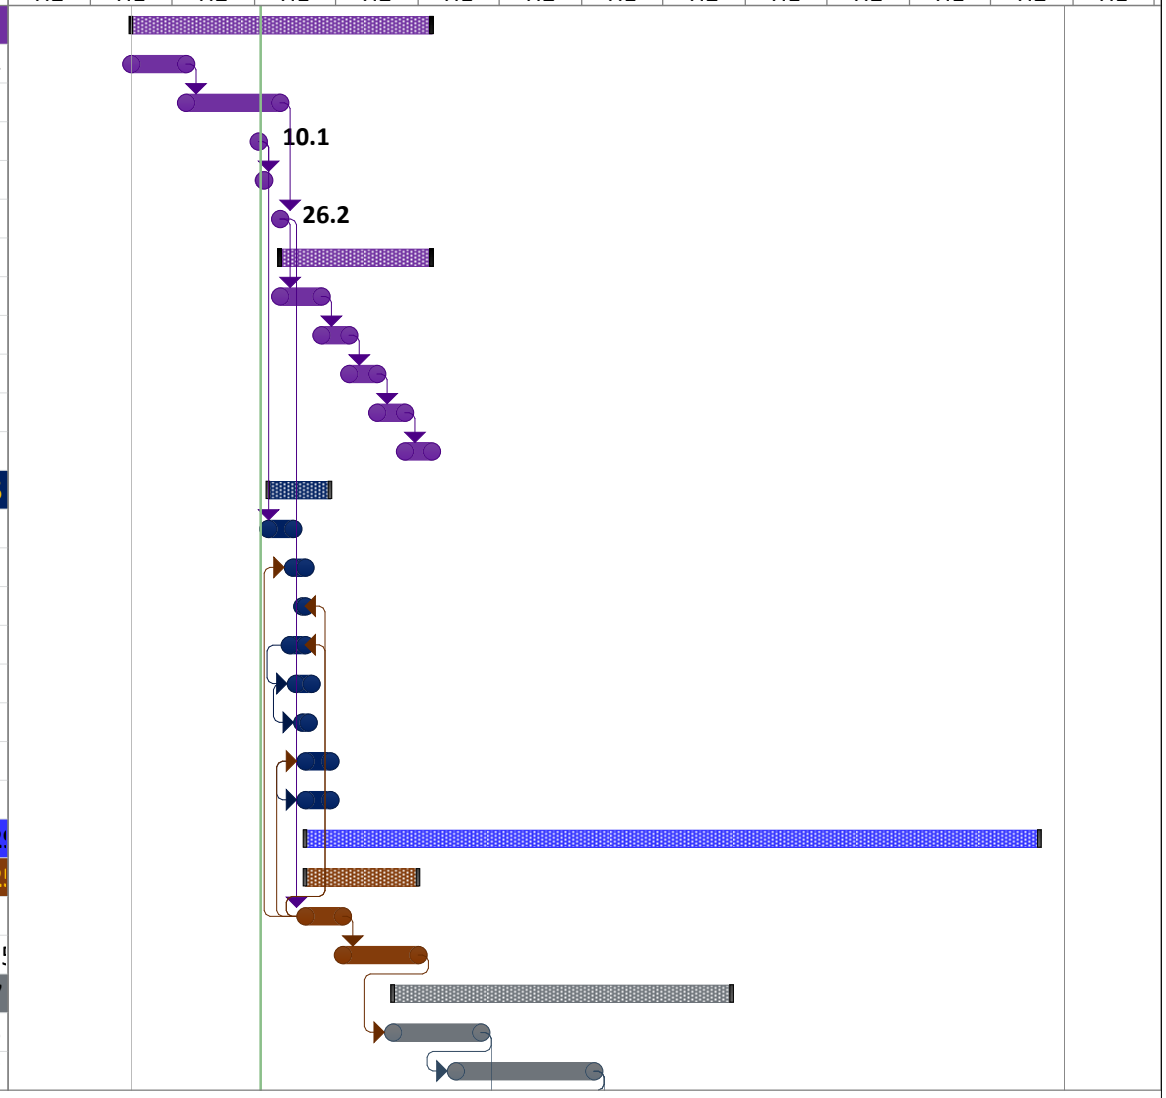


Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11.2026

Verkáætlun Traðarreitur Vestri
Verk 160
Útgáfa A

JÁVERK

ID	Verkþáttur	Upphaf	Lok
29	Fasi 2 - Vallartröð	Thu 21.5.26	Wed 24.2.27
30	Fasi 3 - Neðstatröð	Thu 28.1.27	Wed 3.11.27
31	Fasi 4 - Mannlífsás	Thu 25.2.27	Wed 1.12.27
32	**Frágangur utanhúss**	**Thu 8.10.26**	**Wed 5.9.29**
33	Fasi 1 - Digranesvegur	Thu 8.10.26	Wed 1.12.27
34	Fasi 2 - Vallartröð	Thu 12.8.27	Wed 12.7.28
35	Fasi 3 - Neðstatröð	Thu 23.3.28	Wed 21.2.29
36	Fasi 4 - Mannlífsás	Thu 2.11.28	Wed 5.9.29
37	**Frágangur innanhúss**	**Thu 8.10.26**	**Wed 3.10.29**
38	Bílakjallari	Thu 30.12.2	Wed 22.3.28
39	Fasi 1 - Digranesvegur	Thu 8.10.26	Wed 1.12.27
40	Fasi 2 - Vallartröð	Thu 15.7.27	Wed 12.7.28
41	Fasi 3 - Neðstatröð	Thu 24.2.28	Wed 21.3.29
42	Fasi 4 - Mannlífsás	Thu 2.11.28	Wed 3.10.29
43	**Lóð**	**Thu 2.12.27**	**Wed 17.10.2**
44	Innigarður	Thu 2.12.27	Wed 23.2.28
45	Digranesvegur	Thu 2.12.27	Wed 29.12.2
46	Vallatröð	Thu 13.7.28	Wed 2.8.28
47	Neðstatröð	Thu 22.2.29	Wed 14.3.29
48	Mannlífsás	Thu 6.9.29	Wed 17.10.2
49	**Skil**	**Thu 24.2.28**	**Wed 14.11.2**
50	Fasi 1 - Digranesvegur	Thu 24.2.28	Wed 22.3.28
51	Fasi 2 - Vallartröð	Thu 3.8.28	Wed 30.8.28
52	Fasi 3 - Neðstatröð	Thu 22.3.29	Wed 18.4.29
53	Fasi 4 - Mannlífsás	Thu 18.10.2	Wed 14.11.2
54	**Sölufasi**	**Thu 15.7.27**	**Wed 12.12.2**

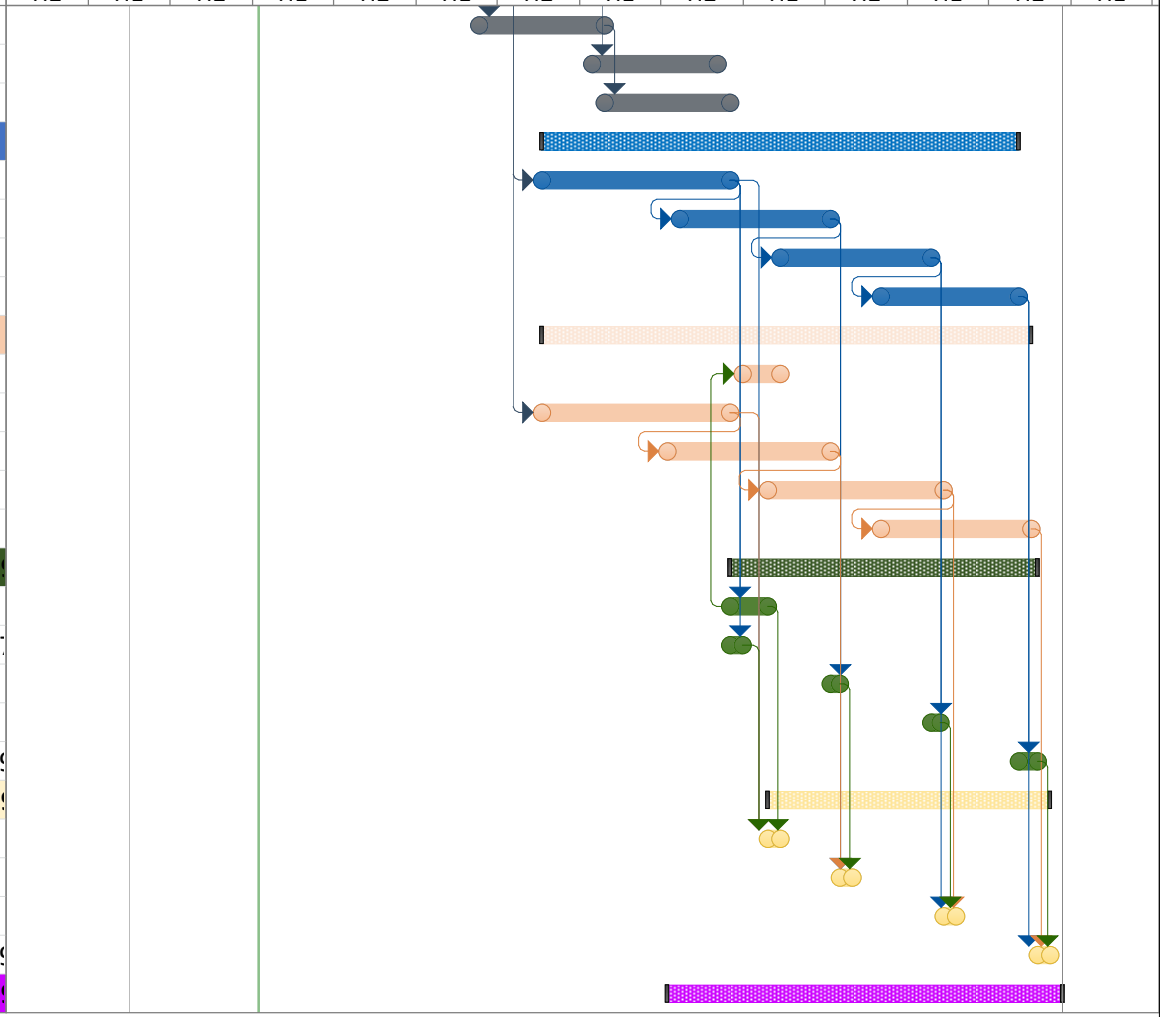

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11.2026
